

社会資本総合整備計画

事後評価書

|            |                                             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
|------------|---------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|
| 計画の名称      | 滝沢市における循環のみの実現（防災・安全）第3期                    |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 計画の期間      | 令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）                        |  |     |   |     |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 |                       |   |   |
| 交付対象       | 滝沢市                                         |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 計画の目標      | 下水道施設の改築・更新を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。 |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
|            |                                             |  |     |   |     |   |   |   |   |   |           |                       |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）                                 |  | 448 | A | 448 | B | 0 | C | 0 | D | 0         | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                     |                |       |       |
|----|----------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                      | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                                    | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                                    | R2当初           | R4末   | R6末   |
| 1  | 管渠の改築更新実施率0%（R2当初）を100%（R6末）に増加させる。                |                |       |       |
|    | 管渠の改築更新実施率<br>更生・布設替実施済み管渠延長（m）／更生・布設替工に必要な管渠延長（m） | 0%             | 0%    | 100%  |
| 2  | 取付管の改築更新実施率0%（R2当初）を100%(R6末)に増加させる。               |                |       |       |
|    | 取付管の改築更新実施率<br>改築更新済み箇所（箇所）／改築更新が必要な箇所（箇所）         | 0%             | 100%  | 100%  |
| 3  | 人孔蓋の改築更新実施率0%（R2当初）を100%（R6末）に増加させる。               |                |       |       |
|    | 人孔蓋の改築更新実施率<br>改築更新済み箇所（箇所）／改築更新が必要な箇所（箇所）         | 0%             | 46%   | 100%  |
| 4  | マンホールポンプの更新実施率0%（R2当初）を100%（R6末）に増加させる。            |                |       |       |
|    | マンホールポンプの更新実施率<br>更新済み箇所（箇所）／改築更新が必要な箇所（箇所）        | 0%             | 55%   | 100%  |
|    |                                                    |                |       |       |
|    |                                                    |                |       |       |
|    |                                                    |                |       |       |
|    |                                                    |                |       |       |

|     |           |                       |          |                       |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |                       |          |                       |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------------|------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|-----|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1       | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）      | 事業内容<br>（延長・面積等）                               | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 滝沢市      | 直接       | 滝沢市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 管渠等（改築更新対策）             | 管渠L=396m、取付管N=74箇所<br>、人孔蓋N=96箇所、MP N=11<br>箇所 | 滝沢市              | ■          | ■ | ■ | ■ | ■ | 367            |           | 策定中            |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | ストックマネジメント           |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 滝沢市      | 直接       | 滝沢市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 管渠等（改築更新計画）             | アセットマネジメント・スト<br>ックマネジメント計画策定                  | 滝沢市              | ■          | ■ |   |   |   | 25             |           | 策定済            |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | ストックマネジメント           |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A07-003 | 下水道                  | 一般       | 滝沢市      | 直接       | 滝沢市 | 管渠（<br>污水） | 改築   | 管渠等（改築更新計画）             | 滝沢市不明水対策実施計画策<br>定                             | 滝沢市              |            |   |   |   | ■ | ■              | 26        |                | 策定済 |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | ストックマネジメント           |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         | A07-004 | 下水道                  | 一般       | 滝沢市      | 直接       | 滝沢市 | 管渠（<br>雨水） | 新設   | 管渠等（下水道情報デジ<br>タル化支援事業） | 雨水台帳システム構築業務                                   | 滝沢市              |            |   |   |   | ■ | ■              | 30        |                | 策定済 |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         | 情報デジタル化支援事業          |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                | 小計               |            |   |   |   |   |                | 448       |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         | 合計                                             |                  |            |   |   |   |   | 448            |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |
|         |         |                      |          |          |          |     |            |      |                         |                                                |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |     |

## 事後評価

### ○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

滝沢市上下水道事業経営審議会において実施

事後評価の実施時期

令和7年8月

公表の方法

市のホームページに掲載

### ○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・管渠の更新を実施することにより、機能維持を図ることができた。
- ・取付管及び人孔蓋の更新を実施することにより、機能維持を図ることができた。
- ・マンホールポンプの更新を実施することにより、機能維持を図ることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）


### ○特記事項（今後の方針等）

- ・引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

| ○目標値の達成状況 |                                       |      |                                                   |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 番号        | 指標（略称）                                |      |                                                   |
|           | 目標値／実績値                               |      | 目標値と実績値に差が出た要因                                    |
| 1         | 更生・布設替実施済み管渠延長（m）／更生・布設替工事が必要な管渠延長（m） |      |                                                   |
|           | 最 終<br>目標値                            | 100% | 交付金等予算が確保できなかったため。                                |
|           | 最 終<br>実績値                            | 28%  |                                                   |
| 2         | 改築更新済み箇所（箇所）／改築更新が必要な箇所（箇所）           |      |                                                   |
|           | 最 終<br>目標値                            | 100% | 目標達成                                              |
|           | 最 終<br>実績値                            | 100% |                                                   |
| 3         | 改築更新済み箇所（箇所）／改築更新が必要な箇所（箇所）           |      |                                                   |
|           | 最 終<br>目標値                            | 100% | 取付管とマンホールポンプの工事を優先したことにより、人孔蓋更新工事の予算（交付金）が不足したため。 |
|           | 最 終<br>実績値                            | 85%  |                                                   |
| 4         | 改築更新済み箇所（箇所）／改築更新が必要な箇所（箇所）           |      |                                                   |
|           | 最 終<br>目標値                            | 100% | 目標達成                                              |
|           | 最 終<br>実績値                            | 100% |                                                   |
|           |                                       |      |                                                   |
|           |                                       |      |                                                   |
|           |                                       |      |                                                   |

# (参考図面)

|       |                           |      |     |
|-------|---------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 滝沢市における循環のみちの実現（防災・安全）第3期 |      |     |
| 計画の期間 | 令和02年度～令和06年度（5年間）        | 交付対象 | 滝沢市 |

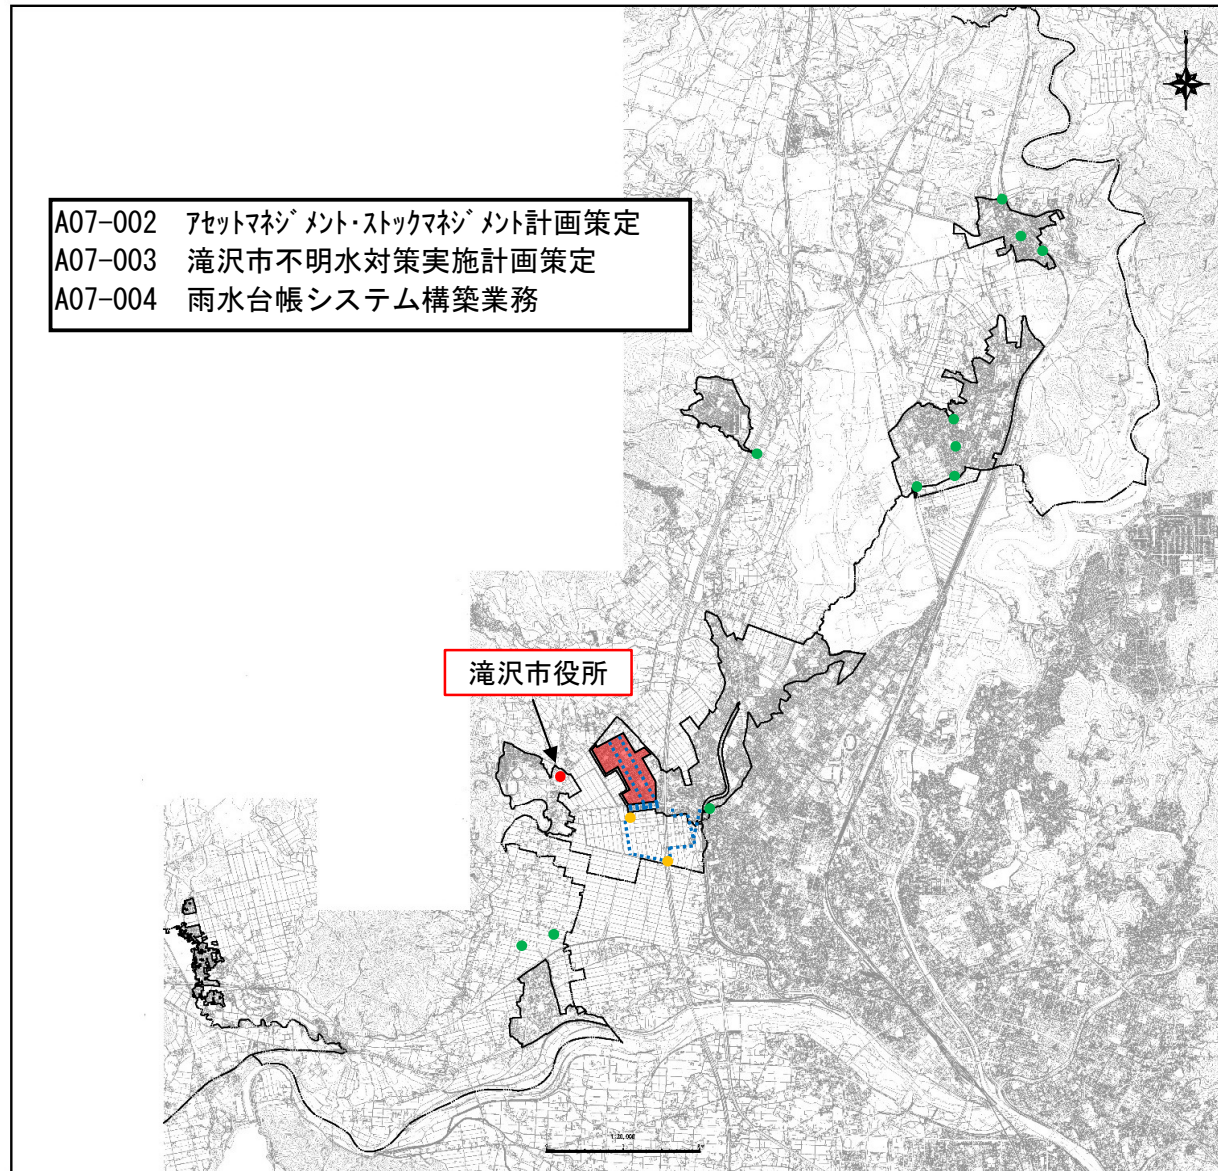

| 凡 例   |                      |
|-------|----------------------|
| —●—   | 行政区域                 |
| —     | 事業計画区域               |
| ●     | A07-001 管渠改築工事       |
| ■     | A07-001 取付管改築工事      |
| ..... | A07-001 マンホール鉄蓋交換工事  |
| ●     | A07-001 マンホールポンプ交換工事 |
