

令和 6 年度 滝沢市下水道事業進捗状況

1 概況

滝沢市の水洗化人口は減少傾向に転じていて、下水道事業経営の収益の大半を占める下水道使用料は、令和 3 年度をピークに減少し始めています。

【滝沢市の下水道使用料の推移】（金額は税抜）

令和 3 年度 525,925,985 円（前年度比 5,823,136 円増 +1.1%）

令和 4 年度 521,839,155 円（前年度比 4,086,830 円減 -0.8%）


令和 5 年度 513,322,000 円（前年度比 8,517,155 円減 -1.6%）

今年度の 4 月から 9 月までの下水道使用料は、前年度を上回っています。

【下水道使用料（4 月～9 月）の前年度との比較】（金額は税抜）

令和 5 年度（4 月～9 月） 258,226,070 円（前年度比 5,779,510 円減 -2.2%）

令和 6 年度（4 月～9 月） 258,464,520 円（前年度比 238,450 円増 +0.1%）

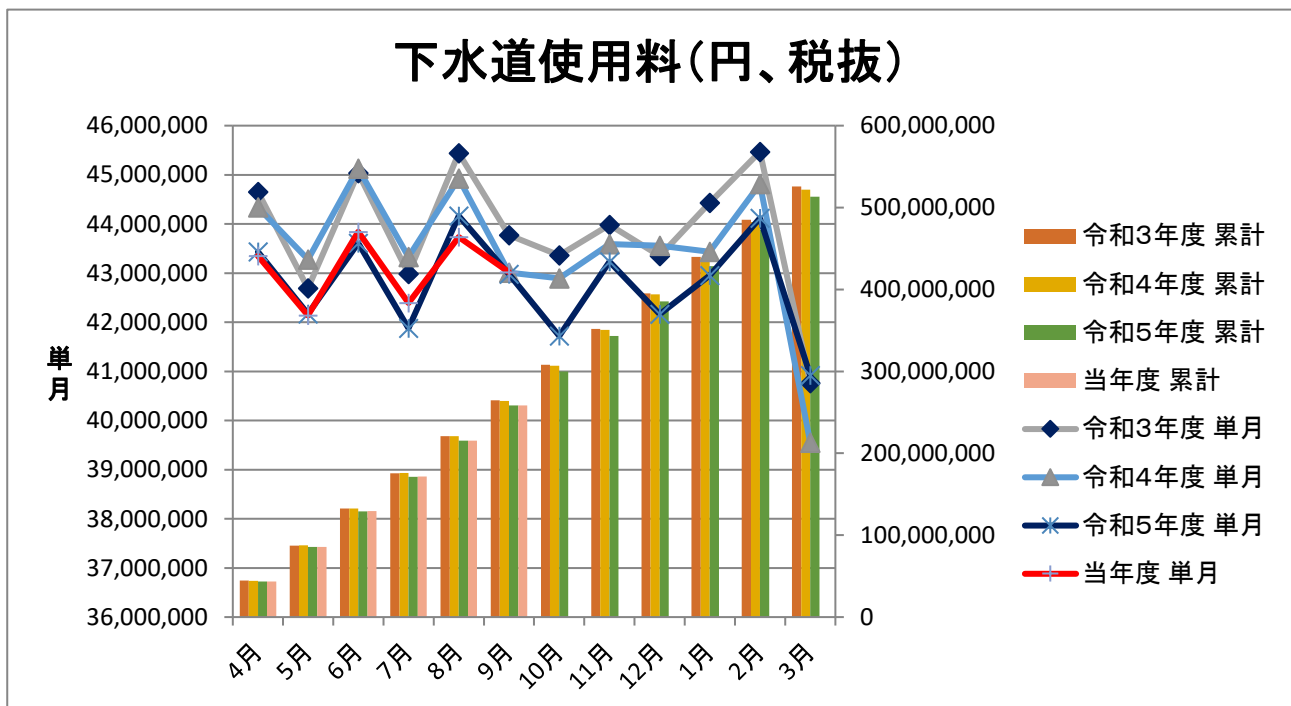

【図 1 下水道使用料の推移】

下水道使用料が減少するスピードが今年度に入って鈍化したと捉えることができ、現時点で、令和 6 年度は令和 5 年度並みの下水道使用料を見込みます。

【令和 6 年度下水道使用料見込み】（税抜）

$258,464,520 \div 258,226,070 \times 513,322,000 \div 513,796,010$ 円

2 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円、消費税及び地方消費税抜)

	令和6年度 予定損益計算書 A	(参考)令和5年度 決算損益計算書 B	比較増減 A－B
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	513,796	513,322	474
(2) 他会計負担金	26,197	24,044	2,153
(3) 他会計補助金	231,101	209,926	21,175
(4) その他営業収益	813	843	△ 30
営業収益 計 ①	771,907	748,135	23,772
2 営業費用			
(1) 管渠費	65,706	45,260	20,446
(2) 雨水処理費	2,364	689	1,675
(3) 流域下水道管理費	203,530	203,604	△ 74
(4) 業務費	50,618	48,228	2,390
(5) 総係費	16,957	32,794	△ 15,837
(6) 減価償却費	586,748	585,451	1,297
(7) 資産減耗費	4,641	46,016	△ 41,375
(8) 普及促進費	340	0	340
(9) その他営業費用	557	519	38
営業費用 計 ②	931,461	962,561	△ 31,100
営業損益 (③＝①－②)	△ 159,554	△ 214,426	54,872
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1	0	1
(2) 他会計負担金	2,112	2,063	49
(3) 引当金戻入益	2,126	1,936	190
(4) 長期前受金戻入益	320,015	361,045	△ 41,030
(5) 雑収益	101	5	96
営業外収益 計 ④	324,355	365,049	△ 40,694
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,470	69,456	△ 2,986
(2) その他営業外費用	0	5	△ 5
営業外費用 計 ⑤	66,470	69,461	△ 2,991
営業外損益 (⑥＝④－⑤)	257,885	295,588	△ 37,703
経常利益 (⑦＝③＋⑥)	98,331	81,162	17,169
当年度純利益 (⑦＋その他)	98,331	81,162	17,169

3 事業進捗状況

令和5年度第4回滝沢市上下水道事業経営審議会審議事項「令和6年度下水道事業の予算基本方針」により、令和6年度に実施する予定としていた事業等について、今年度の進捗状況は以下のとおりです。

■下水道整備事業（污水）

- ・砂込第一処理分区管渠整備工事 L=320m
- ・砂込第一処理分区工事監督業務 N=1 式
- ・砂込第一処理分区舗装復旧工事 A=960 m²
- ・事業計画変更 N=1 式

⇒

【進捗状況】

- ・砂込第一処理分区管渠整備工事 L=42.5m
- ・砂込第一処理分区工事支援業務 N=1 式
- ・公共下水道舗装復旧工事 A=867 m²
- ・事業計画変更 N=1 式

■下水道改築事業（污水）

- ・鵜飼西地区污水管改築工事 L=100m
- ・穴口、巣子第4、滝沢駅前第2マンホールポンプ改築工事 N=3 箇所
- ・穴口、鵜飼西地区マンホール蓋交換工事 N=50 箇所
- ・鵜飼西取付管テレビカメラ調査業務 N=5 箇所
- ・鵜飼西取付管更新工事 N=13 箇所
- ・玉7流量計更新工事 N=1 箇所
- ・不明水対策業務 N=1 式

⇒

【進捗状況】

- ・巣子第4、滝沢駅前第2マンホールポンプ更新工事 N=3 台
- ・鵜飼西地区マンホール蓋交換工事 N=40 箇所
- ・鵜飼西取付管更新工事 N=8 箇所
- ・玉7流量計更新工事 N=1 箇所
- ・鵜飼西地区污水管改築工事（発注予定）
- ・大沢第2マンホールポンプ更新工事（発注予定）

■滝沢市水洗便所改造資金利子補給事業（污水）

- ・水洗便所改造資金融資幹旋利子補給金
 - うち新規融資幹旋見込 6 件
 - うち継続分 7 件

⇒

【進捗状況】

新規融資斡旋 0件

継続分 7件

■雨水整備事業

・雨水排水施設築造工事(U3300×1000) L=60m

・雨水台帳システム構築業務 N=1式

⇒

【進捗状況】

・雨水排水施設築造工事(U1400×1400) L=44m

・雨水台帳システム構築業務 N=1式

■合併処理浄化槽設置整備補助事業

・合併処理浄化槽補助設置基数

人槽	基数	単価（新築住宅）	単価（既存住宅）
5人槽	33基	390,000円	480,000円
7人槽	15基	474,000円	590,000円
10人槽	2基	660,000円	820,000円

⇒

【進捗状況】

人槽	基数	単価（新築住宅）	単価（既存住宅）
5人槽	17基	390,000円	480,000円
7人槽	10基	474,000円	590,000円
10人槽	1基	660,000円	820,000円

■滝沢市水洗便所改造資金利子補給事業

・水洗便所改造資金融資斡旋利子補給金

うち新規融資斡旋見込み 1件

⇒

【進捗状況】

新規融資斡旋 0件
