

令和 7 年度 滝沢市水道事業進捗状況

1 概況

滝沢市の給水人口は減少傾向に転じており、水道事業経営の収益の大半を占める給水収益（水道料金収入）も令和 3 年度をピークに減少し始めていますが、令和 6 年度については、ほぼ前年度並みの料金収入となっています。


(1) 滝沢市の給水収益の推移（金額は税抜）

年度	調定金額（円）	前年度比（円）	前年度比（％）
令和 3 年度	870,094,041	5,594,683	0.6
令和 4 年度	859,284,059	▲10,809,982	▲1.2
令和 5 年度	850,888,763	▲8,395,296	▲1.0
令和 6 年度	853,549,835	2,661,072	0.3

※参考 令和 6 年度第 4 回経営審議会資料における R 6 決算見込値 853,689,101 円

(2) 第 2 四半期における給水収益の状況（金額は税抜）

	調定金額（円）	前年度比（円）	前年度比（％）
R 6（4 月～9 月）	430,827,211	1,413,233	0.3
R 7（4 月～9 月）	428,202,344	▲2,624,867	▲0.6

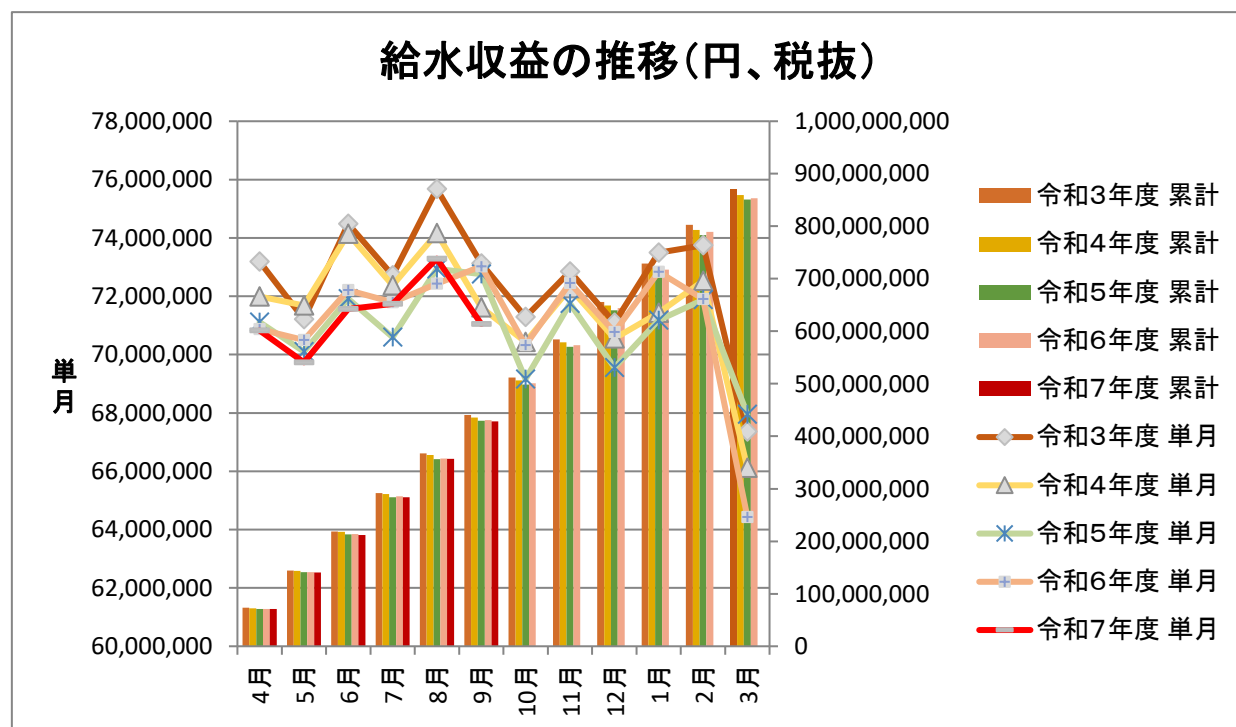

今年度の給水収益の傾向としては、猛暑の影響により 8 月のみ前年度を上回りましたが総じて前年度を下回っている状況です。また、現時点では過去 5 年間で最も給水収益

が少なかった令和５年度を下回っています。このことから、今年度の給水収益は前年度を下回るとともに、過去５年間で最も少ない給水収益となることが見込まれます。

【令和７年度給水収益見込み】（税抜）

令和７年度第２四半期調定金額 428,202,344 円…①

令和６年度第２四半期調定金額 430,827,211 円…②

令和６年度調定金額累計 853,549,835 円…③

$$\textcircled{1} \div \textcircled{2} \times \textcircled{3} \div \underline{848,349,479 \text{ 円}}$$

2 水道事業会計損益計算書

(単位：円、消費税及び地方消費税抜)

	令和6年度 第2四半期 (B) [令和6年4月1日から 令和6年9月30日まで]	令和7年度 第2四半期 (A) [令和7年4月1日から 令和7年9月30日まで]	比較増減 A - B	(参考) 令和6年度決算 [令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで]
1 営業収益				
(1) 給水収益	430,827,211	428,202,344	△ 2,624,867	853,549,835
(2) 受託工事収益	0	0	0	6,454,000
(3) その他営業収益	9,883,937	5,404,114	△ 4,479,823	71,285,045
営業収益 計 ①	440,711,148	433,606,458	△ 7,104,690	931,288,880
2 営業費用				
(1) 原水及び浄水費	45,768,828	46,814,638	1,045,810	132,860,551
(2) 配水及び給水費	19,472,011	14,669,561	△ 4,802,450	62,520,686
(3) 受託工事費	6,454,000	0	△ 6,454,000	6,454,000
(4) 業務費	45,620,013	46,530,140	910,127	111,866,026
(5) 総係費	29,055,376	28,356,756	△ 698,620	70,454,594
(6) 減価償却費	0	0	0	398,341,514
(7) 資産減耗費	0	0	0	20,928,376
(8) その他営業費用	91,980	101,037	9,057	212,208
営業費用 計 ②	146,462,208	136,472,132	△ 9,990,076	803,637,955
営業損益 (③=①-②)	294,248,940	297,134,326	2,885,386	127,650,925
3 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	9,148	625,000	615,852	9,148
(2) 他会計補助金	0	0	0	4,090,000
(3) 引当金戻入益	6,008,652	6,940,847	932,195	6,111,145
(4) 長期前受金戻入益	0	0	0	87,255,335
(5) 雑収益	56,760	114,763	58,003	631,529
営業外収益 計 ④	6,074,560	7,680,610	1,606,050	98,097,157
4 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,425,173	12,303,261	△ 121,912	24,286,432
(2) 雑支出	0	0	0	568,703
営業外費用 計 ⑤	12,425,173	12,303,261	△ 121,912	24,855,135
営業外損益 (⑥=④-⑤)	△ 6,350,613	△ 4,622,651	1,727,962	73,242,022
経常利益 (⑦=③+⑥)	287,898,327	292,511,675	4,613,348	200,892,947
当年度純利益 (⑦+その他)	287,898,327	292,511,675	4,613,348	200,892,947

3 事業進捗状況

令和6年度第4回滝沢市上下水道事業経営審議会審議事項「令和7年度水道事業の予算基本方針」により、令和7年度に実施する予定としていた主な事業について、今年度の事業進捗状況は以下のとおりです。

【安心・安全】安心して飲むことができる安全な水道

1 一本木水源関連施設整備	
R7計画	・一本木水源（柳沢大湧口）の連絡管整備
R7進捗状況	・送水管布設（柳沢地区）工事 一式 （9月末時点で入札公告済） ダクトイル鑄鉄管 φ150 L=331.5m

2 水源保全施策の実施	
R7計画	水道水源保護条例に基づき事業を実施します。 ・市所有の水源涵養地の維持管理（除草・間伐等） ・水源保全用地の取得について検討します。 ・水道水源保護区域内における浄化槽設置整備事業費補助金の交付
R7進捗状況	・水道水源保護区域内における合併処理浄化槽補助金申請は令和7年は10月末時点では0件です。 ・市所有の水源涵養地の維持管理として除草等を実施しました。 ・水源保全用地の取得の検討に合わせて用地の調査を進めています。

3 水質管理の徹底	
R7計画	水質検査計画に基づき水質検査を実施し、安全でおいしい水の供給を図るとともに、引き続き水源監視体制の徹底を図ります。 ・定期水質検査、臨時水質検査
R7進捗状況	水質検査計画に基づき水質検査を実施し、安全でおいしい水の供給を図るとともに、引き続き水源監視体制の徹底を図っています。 ・定期水質検査、毎日水質検査を実施しています。 ・令和8年度からPFOS及びPFOAが水質基準項目に加えられる事から同基準（浄水の各配水系統一か所で年4回、全原水で年1回）の検査も先行し実施しています。

4 滞留水排水の強化	
R7計画	各配水系の境界、末端給水箇所など水道水が滞留しやすい箇所の排

	<p>水を行い、安心安全な水道水の供給に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消火栓、ドレンによる定期的な滞留水排水の実施
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・各配水系の境界、末端給水箇所など水道水が滞留しやすい箇所について、安心安全な水道水の供給に努めています。 ・状況により滞留水排水を実施しています。

5 適正な水圧管理の維持	
R 7 計画	<p>減圧弁の維持管理を適正に行い、利用者が快適に使えるよう、配水管の水圧を適正に保ちます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・減圧弁保守点検の実施
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・減圧弁点検業務 一式 (契約済)

6 断水範囲の縮小	
R 7 計画	<ul style="list-style-type: none"> ・管路更新に合わせた管路・仕切弁の整備
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・管路更新工事に合わせて、管路及び仕切弁を整備し断水範囲を縮小しています。

【安定・強靱】安定した給水を実現する強靱な水道

1 水道施設改良更新事業	
R 7 計画	<p>基幹水道施設の更新を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電気・計測機器等更新 一式
R 7 進捗状況	<p>保守点検等で経年劣化の指摘があった、柳沢低区浄水場及び姥屋敷配水池の電気設備と機械設備の更新を行っています。また、柳沢低区浄水場の取水停止に伴う受水管更新工事を行っています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柳沢低区浄水場外水質計器等更新工事 一式 (契約済) ・柳沢低区浄水場受水管更新工事 一式 (契約済)

2 配水管整備事業	
R 7 計画	<p>経年管のうち漏水事故の多いビニール管を中心に耐震管へ布設替えを進め、断水事故を減らし、水資源の有効利用に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビニール管の耐震管への布設替え ・道路改良事業等に合わせた事業費の抑制 ・配水管布設替工事 2, 500 m
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ビニール管の耐震管への布設替えを行っています。 ・道路改良事業等に合わせた施工とすることで事業費の抑制を行っ

	ています。 ・配水管布設替（大崎地区）工事 一式 他6件 （契約済）
--	---------------------------------------

<管路耐震化率>

年 度		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
配水管（％）	目標値	35.9	35.9	36.5	37.0
	実績値	35.7	36.4	36.7	—
幹線（％）	目標値	27.1	27.1	27.1	27.1
	実績値	26.2	27.4	27.7	—

※配水管は、導水管・送水管を除く。幹線は導水管・送水管及びφ200以上の配水管とする。

<経年管更新率>

年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目標値（％）	1.0	1.0	1.0	1.0
実績値（％）	1.0	0.6	0.3	—

3 漏水対策事業

R7計画	・漏水調査委託 380km ・漏水発見後の迅速な修理 発見箇所数
R7進捗状況	・漏水調査委託 166km ・上水道漏水調査委託業務 一式 （契約済）

<有効率>

年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目標値（％）	93.4	93.4	93.4	93.4
実績値（％）	94.1	94.3	93.5	—

【環境・持続】環境に配慮した持続可能な水道

1 顧客サービスの向上

R7計画	・上下水道広報誌「ちゃぐ水だより」の発行（年3回）と、それを通じて寄せられた利用者からのご意見、ご感想等の分析 ・リニューアルしたホームページのコンテンツ拡充
R7進捗状況	・発行回数を見直し、8月、12月の年2回発行する内容で委託業者と契約しています。 ・施設見学会や滝祭 2025（滝沢市産業まつり）への出展等により広聴

	<p>広報活動の充実を図りました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下水源のPRを推進し、PR動画をホームページで公開予定です。
--	--

2 環境対策の推進	
R 7 計画	<ul style="list-style-type: none"> ・汚泥や建設副産物の適正な処理に努めます。 ・浄水場の適正な運転管理を行い、すべての配水池からの自然流下での給水を維持し、水の位置エネルギーを有効活用、省エネルギー化に努めます。
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・汚泥や建設副産物の適正な処理に努めます。 ・浄水場の適正な運転管理を行い、すべての配水池からの自然流下での給水を維持し、水の位置エネルギーを有効活用、省エネルギー化に努めます。

3 財政の健全化	
R 7 計画	<ul style="list-style-type: none"> ・水道施設更新計画の策定に合わせた財政シミュレーションの実施 ・料金徴収業務委託の継続による目標過年度分収納率99.98%の達成
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管更新計画と基幹水道施設更新計画を合わせて「令和6年度滝沢市水道施設更新計画策定業務」として業務委託をしており、令和7年度中に策定予定です。 ・R9年度までの財政シミュレーションを一部行い、今後の財政状況の見通の確認を行いました。 ・今年度における過年度分（令和6年度調定分）についての収納率は目標値を達成する見込みです。

<過年度分収納率>

年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
目標値（%）	99.98	99.98	99.98	99.98
実績値（%）	99.99	99.98	99.99	—

4 人材育成と組織力の強化	
R 7 計画	<ul style="list-style-type: none"> ・技術系職員の継続的な確保 ・積極的な研修の受講
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・経営課、施設課の2課に編成し、特に技術職員の確保に努めています。 ・令和7年度水道技術者ブロック別研修会に参加しました。

5 官民連携・広域連携の推進	
R 7 計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ 料金徴収業務、水道施設運転管理業務の業務委託継続 ・ 日本水道協会や県が開催する合同訓練への参加 ・ 県が主導する水道事業広域連携検討会における広域連携についての継続的な検討
R 7 進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 業務委託を継続しています。 ・ 日本水道協会の 7 月開催の合同訓練に参加しました。 ・ 盛岡広域ブロック検討会に参加し、情報共有、意見交換等を行いました。
