水道資料１

令和６年度　滝沢市水道事業進捗状況

１　概況

滝沢市の給水人口は減少傾向に転じていて、水道事業経営の収益の大半を占める給水収益（水道料金収入）は、令和３年度をピークに減少し始めています。

【滝沢市の給水収益の推移】（金額は税抜）

令和３年度　870,094,041 円（前年度比　5,594,683 円増　＋0.6%）

令和４年度　859,284,059 円（前年度比 10,809,982 円減　－1.2%）

令和５年度　850,888,763 円（前年度比　8,395,296 円減　－1.0%）

今年度の４月から９月までの給水収益は、前年度を上回っています。

【給水収益（４月～９月）の前年度との比較】（金額は税抜）

令和５年度（４月～９月）　429,413,978 円（前年度比　6,544,588 円減　－1.5%）

令和６年度（４月～９月）　430,827,211 円（前年度比　1,413,233 円増　＋0.3%）

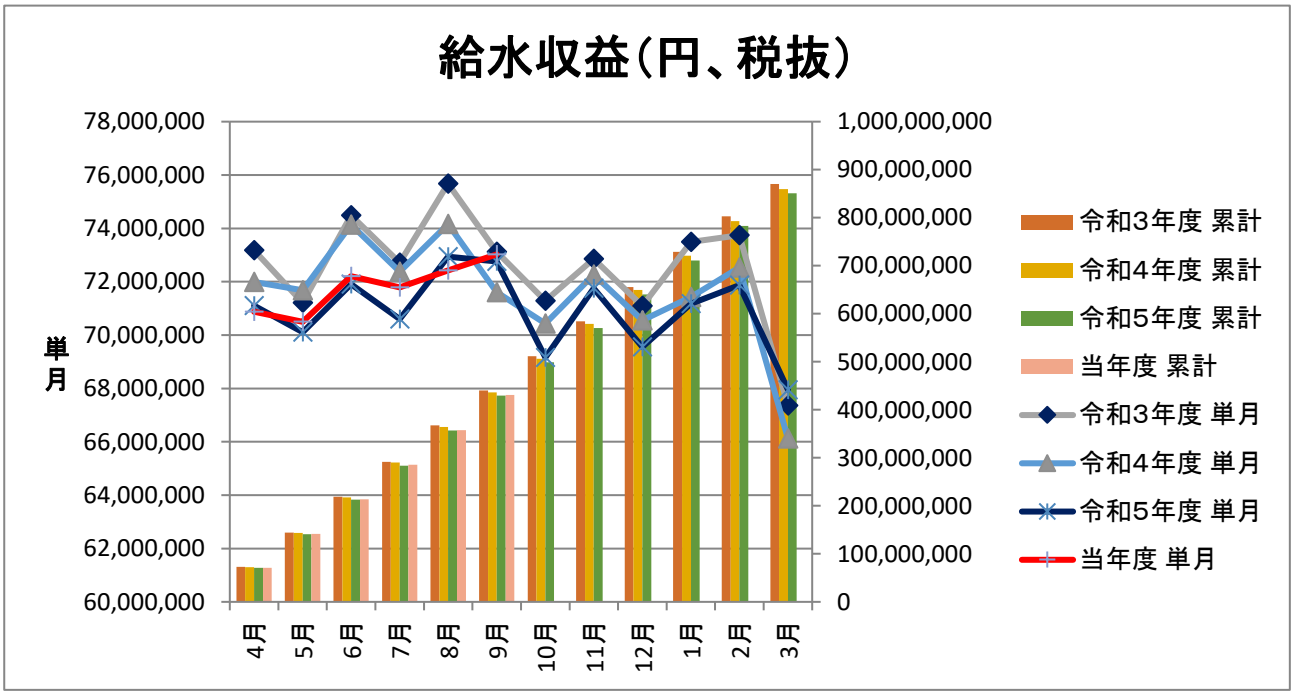

【図１　給水収益の推移】

給水収益が減少するスピードが今年度に入って鈍化したと捉えることができ、現時点で、令和６年度は令和５年度並みの給水収益を見込みます。

【令和６年度給水収益見込み】（税抜）

430,827,211 ÷ 429,413,978 × 850,888,763 ≒ 853,689,101 円

2　予定損益計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：千円、消費税及び地方消費税抜）

	令和6年度 予定損益計算書 A	(参考)令和5年度 決算損益計算書 B	比較増減 A－B
1　営業収益			
(1)　給水収益	853,689	850,889	2,800
(2)　受託工事収益	6,601	0	6,601
(3)　その他営業収益	70,065	69,697	368
営業収益　計　①	930,355	920,586	9,769
2　営業費用			
(1)　原水及び浄水費	171,108	138,409	32,699
(2)　配水及び給水費	103,667	55,017	48,650
(3)　受託工事費	6,455	0	6,455
(4)　業務費	112,320	110,182	2,138
(5)　総係費	71,651	67,596	4,055
(6)　減価償却費	404,630	410,223	△ 5,593
(7)　資産減耗費	15,641	22,591	△ 6,950
(8)　その他営業費用	413	327	86
営業費用　計　②	885,885	804,345	81,540
営業損益　（③＝①－②）	44,470	116,241	△ 71,771
3　営業外収益			
(1)　受取利息及び配当金	8	10	△ 2
(2)　他会計補助金	4,090	4,538	△ 448
(3)　引当金戻入益	6,088	5,656	432
(4)　長期前受金戻入益	87,369	93,560	△ 6,191
(5)　雑収益	270	1,517	△ 1,247
営業外収益　計　④	97,825	105,281	△ 7,456
4　営業外費用			
(1)　支払利息及び企業債取扱諸費	24,977	25,449	△ 472
(2)　雑支出	0	549	△ 549
(3)　その他営業外費用	0	6	△ 6
営業外費用　計　⑤	24,977	26,004	△ 1,027
営業外損益　（⑥＝④－⑤）	72,848	79,277	△ 6,429
経常利益　（⑦＝③＋⑥）	117,318	195,518	△ 78,200
当年度純利益　（⑦＋その他）	117,318	195,518	△ 78,200

３　事業進捗状況

令和５年度第４回滝沢市上下水道事業経営審議会審議事項「令和６年度水道事業の予算基本方針」により、令和６年度に実施する予定としていた事業等について、今年度の事業進捗状況は以下のとおりです。

【安心・安全】安心して飲むことができる安全な水道

■一本木水源関連施設整備
・一本木水源（柳沢大湧口）の連絡管整備
⇒
【進捗状況】
・送水管布設（柳沢地区）工事を施工中です。
　ダクタイル鋳鉄管　φ１５０　Ｌ＝５１２．９ｍ

■水源保全施策の実施
・合併処理浄化槽補助金交付　５人槽・７人槽・１０人槽各１件
・市所有の水源涵養地の維持管理（除草・間伐等）
・水源保全用地の取得について検討
⇒
【進捗状況】
・合併処理浄化槽補助金申請は令和６年１０月末時点では０件です。
・市所有の水源涵養地の維持管理として除草・間伐等を実施しました。
・水源保全用地の取得の検討に合わせて、水源保護区域の見直しをすすめています。

■水質管理の徹底
・定期水質検査、臨時水質検査
⇒
【進捗状況】
水質検査計画に基づき水質検査を実施し、安全でおいしい水の供給を図るとともに、引き続き水源監視体制の徹底を図っています。
・定期水質検査を実施しています。
・定期水質検査においてＰＦＯＳ及びＰＦＯＡは検出されませんでした。

■滞留水排水の強化
・消火栓、ドレンによる定期的な滞留水排水の実施
⇒
【進捗状況】
・各配水系の境界、末端給水箇所など水道水が滞留しやすい箇所の排水を行い、安心安全な水道水の供給に努めています。

■適正な水圧管理の維持
・減圧弁保守点検の実施
⇒
【進捗状況】
・減圧弁点検を実施し、配水管の水圧を適正に保っています。

■断水範囲の縮小
・管路更新に合わせた管路・仕切弁の整備
⇒
【進捗状況】
・管路更新工事に合わせて、管路及び仕切弁を整備し断水範囲を縮小しています。

【安定・強靱】安定した給水を実現する強靭な水道

■水道施設改良更新事業
・電気・計測機器等更新　一式
⇒
【進捗状況】
　保守点検等で経年劣化が指摘された､湯舟沢配水池の電気設備と機械設備の更新を行い、滝沢浄水場外の耐用年数を超えた機器や部品についても更新を行っています。また、柳沢低区浄水場の取水停止に伴う送水管切替工事設計を行っています。
・湯舟沢配水池ほか電気設備等更新工事　一式
・滝沢浄水場外水質計器等更新工事　一式
・柳沢低区浄水場送水管切替工事設計業務　一式

■配水管整備事業
・ビニール管の耐震管への布設替え
・道路改良事業等に合わせての事業費の抑制
⇒
【進捗状況】
・ビニール管の耐震管への布設替えを行っています。
・道路改良事業等に合わせての事業費の抑制を行っています。

＜管路耐震化率＞

年　　度		令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
配水管（％）	目標値	35.0	35.9	35.9	36.5
	実績値	35.3	35.7	36.4	―
幹線（％）	目標値	26.9	27.1	27.1	27.1
	実績値	25.9	26.2	27.4	―

※配水管は、導水管・送水管を除く。幹線は導水管・送水管及びφ２００以上の配水管とする。

■経年管更新事業

・配水管布設替工事　２，５００ｍ

⇒

【進捗状況】

・配水管布設替工事　Ｌ＝　９９５ｍ

＜経年管更新率＞

年　度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
目標値（％）	1.5	1.0	1.0	1.0
実績値（％）	0.6	1.0	0.6	―

■漏水対策事業

・漏水調査委託　３８０ｋｍ

・漏水発見後の迅速な修理　発見個所数

⇒

【進捗状況】

・漏水調査委託　１０５ｋｍ

・漏水発見後の迅速な修理　発見個所数

＜有効率＞

年　度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
目標値（％）	93.2	93.4	93.4	93.4
実績値（％）	94.2	94.1	94.3	―

【環境・持続】環境に配慮した持続可能な水道

■顧客サービスの向上

・水道広報誌の発行（年３回）

・ホームページのリニューアル

⇒

【進捗状況】

・年３回発行する内容で委託業者と契約。８月、１２月、３月発行です。
・たきざわ魅力発信室と連携してホームページのリニューアルに向けて取り組んだほか、施設紹介動画等も作成しています。
・令和７年４月１日に給水開始５０周年を迎えることから、記念事業としてペットボトル水作成やオリジナルキャラクターデザインなどを手がけました。水道広報誌「ちゃぐ水だより」夏号では特集記事を掲載しました。

■環境対策の推進
・汚泥や建設副産物の適正な処理
・省エネルギー技術について、今後の導入の可能性について検討
⇒
【進捗状況】
・汚泥や建設副産物の適正な処理に努めています。

■財政の健全化
・令和７年度にかけて配水管更新計画、基幹水道施設更新計画を策定
・目標収納率　過年度分９９．９８％
⇒
【進捗状況】
・配水管更新計画と基幹水道施設更新計画とを合わせて「令和６年度滝沢市水道施設更新計画策定業務」として業務委託をしていて、令和７年度策定予定です。
・今年度における過年度分（令和５年度調定分）についての収納率は目標値を達成する見込みです。

＜過年度分収納率＞

年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度
目標値（%）	99.98	99.98	99.98	99.98
実績値（%）	99.99	99.99	99.98	―

※各年度の前年度調定分水道料金についての収納率

■人材育成と組織力の強化
・上下水道部の再編（３課→２課）
⇒
【進捗状況】
・経営課、施設課の２課に編成し、特に技術職員の確保に努めています。

■官民連携・広域連携の推進
・料金徴収業務、水道施設運転管理業務の業務委託継続
・日本水道協会や県が開催する合同訓練への参加
・県が主導する水道事業広域連携検討会における広域連携についての継続的な検討
⇒

【進捗状況】

・業務委託を継続しています。

・日本水道協会の８月開催の合同訓練に参加をする予定でしたが、天候の影響により中止になりました。

・盛岡広域ブロック検討会に参加し、情報共有、意見交換等を行いました。
